



BARAUDELLE

Réception 31/07/2025

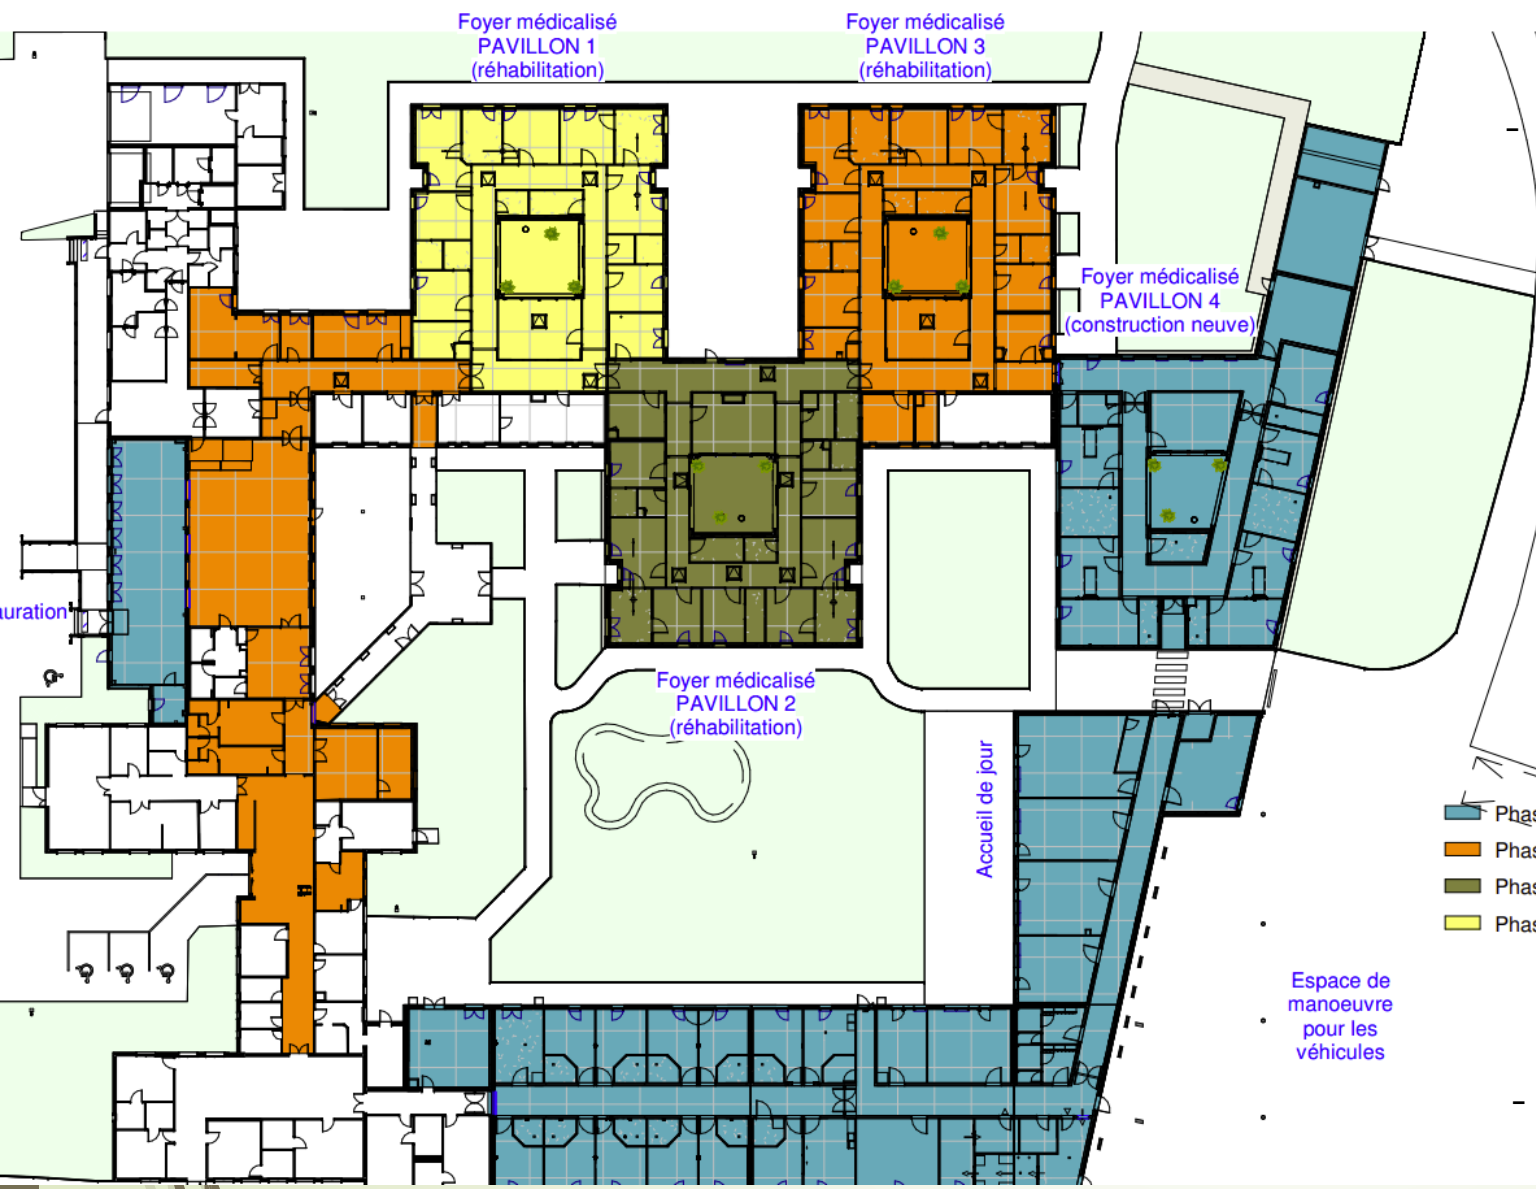

- La phase 01 est livrée depuis 1 an , cette zone comprenait la construction en neuf de la zone foyer de vie , ateliers , activité, pavillon 04 + extension et rénovation de la salle repas + une très grosse partie des extérieurs (abords , cours ect) - Chantier démarré en oct nov 2021 (désamiantage , démolition puis construction) livraison en aout sept 2023
- La Phase 02 a démarré en nov 2023 après déménagement des résidents dans le pavillon 04 neuf Cette zone comprend la rénovation totale du pavillon 03 , zone ancienne lingerie et couloir attenant , zone salle de réunion et bureau sous directrice + mise aux normes désenfumages zone accueil . Livraison de cette phase après la commission sécurité le 17 juillet puis déménagement
- La phase 03 démarrera en sept pour environ 6 mois
- la phase 04 pour finir l'ensemble prévue fin juin 2025

Phase 1 livrée juin 2023 : pavillon 4 + foyer de vie
+ salle restauration





lingerie et couloir attenant

pavillon 03 phase 2 extérieurs

